McMath Construction

Task filtering - Status: Active
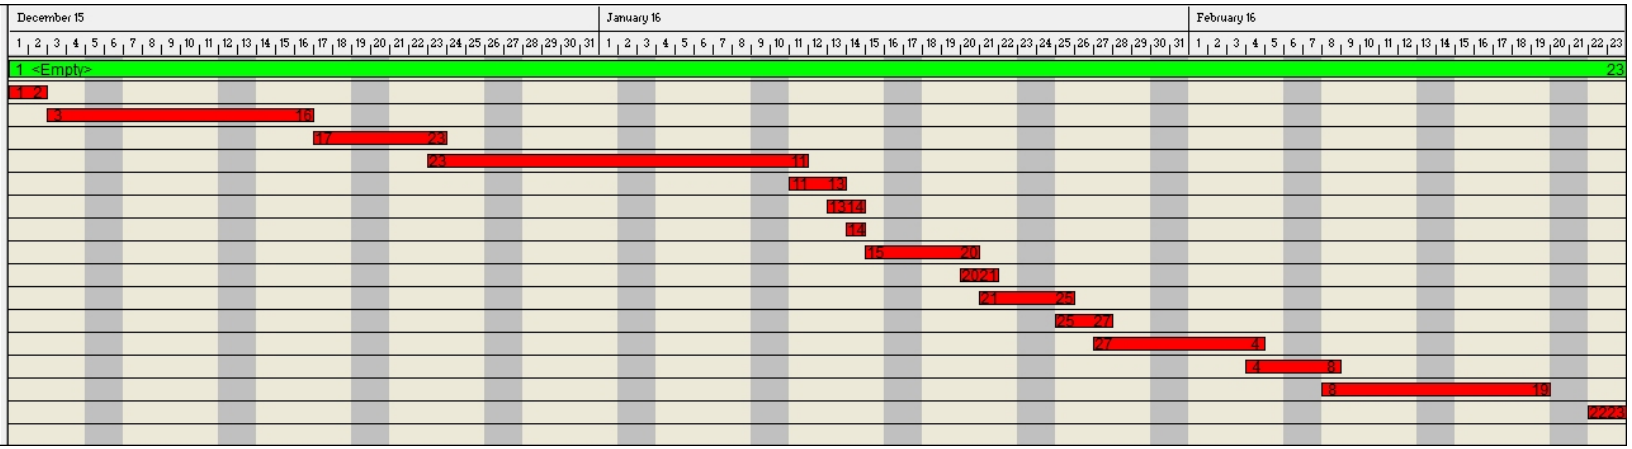
| Task Description | Target... | Dur... | Target... |
|---|---|---|---|
| <Empty> Total Time | 12/01/15 | 85/60 | 02/23/16 |
| Temporary fencing | 12/01/15 | 2 | 12/02/15 |
| Demo existing building | 12/03/15 | 10 | 12/16/15 |
| Form, finish, and pour new foundation | 12/17/15 | 5 | 12/23/15 |
| Rough framing,/ water tight | 12/23/15 | 14 | 01/11/16 |
| Rough in plumbing, mechanical, elec... | 01/11/16 | 3 | 01/13/16 |
| inspections | 01/13/16 | 2 | 01/14/16 |
| Insulate | 01/14/16 | 1 | 01/14/16 |
| Hang & Finish Drywall | 01/15/16 | 4 | 01/20/16 |
| Install Millwork | 01/20/16 | 2 | 01/21/16 |
| Interior Painting | 01/21/16 | 3 | 01/25/16 |
| Trim out Mech, Elec, Plumbing | 01/25/16 | 3 | 01/27/16 |
| Remove existing asphalt | 01/27/16 | 7 | 02/04/16 |
| Install new curbing | 02/04/16 | 3 | 02/08/16 |
| Final grade & Landscape | 02/08/16 | 10 | 02/19/16 |
| Final Inspections | 02/22/16 | 2 | 02/23/16 |
